

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado





Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

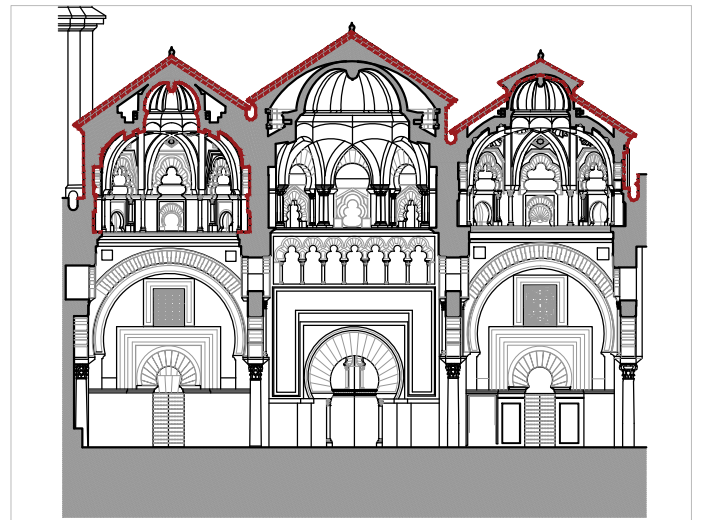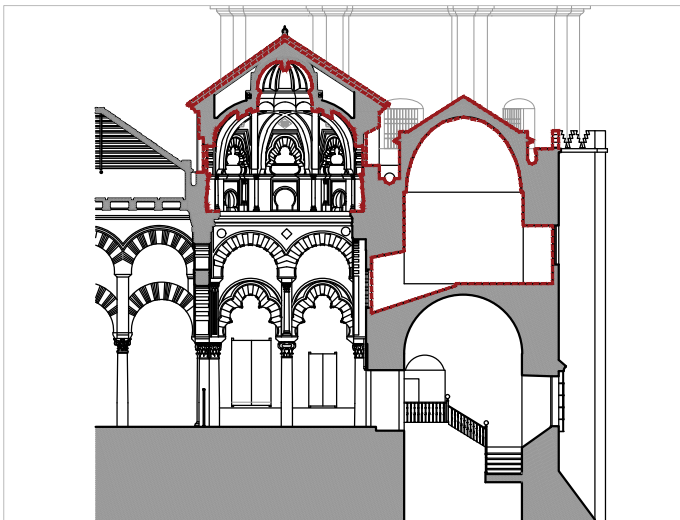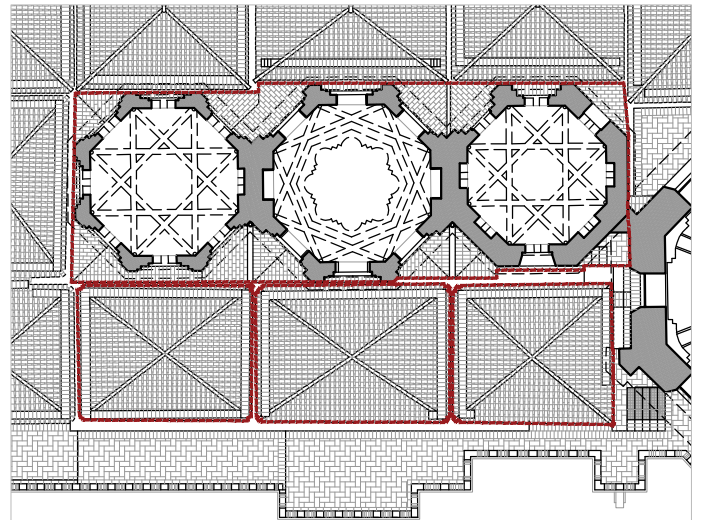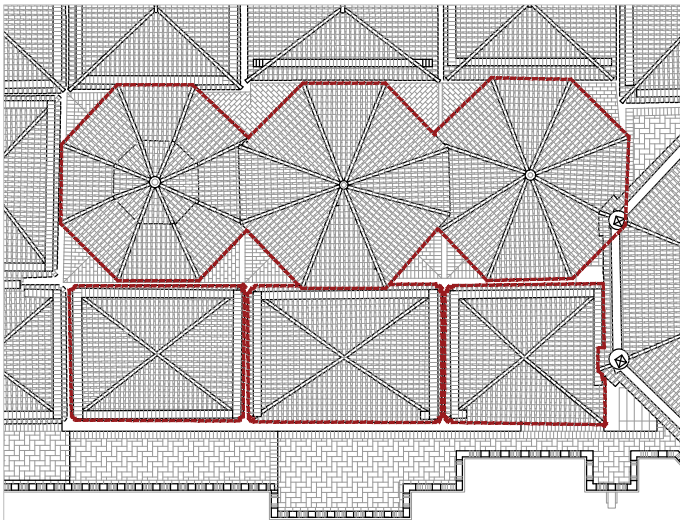

Observaciones

La estructura auxiliar de andamiaje y cubrición provisional se va continuamente modificando y adaptando al avance de los trabajos. Una vez terminada la restauración de los tejados de las cúpulas de la macsura ya se han podido dejar al descubierto. Trasladando la cubierta provisional a la zona sur de la obra para proteger la salas del sabat cuyos tejados están siendo restaurados.

Observaciones

Se continúan los trabajos de restauración de las fachadas de las linternas. Toda la zona norte está prácticamente terminada a satisfacción, quedando pendiente únicamente la limpieza de exterior de las celosías y la colocación de los vidrios de protección.

