

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado





Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrera

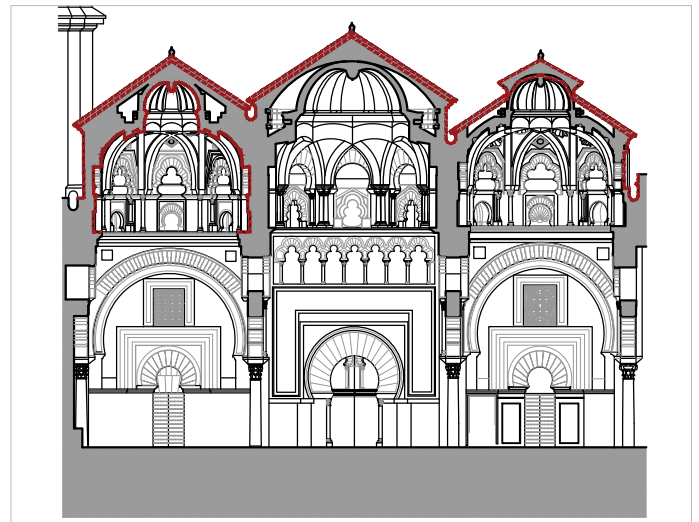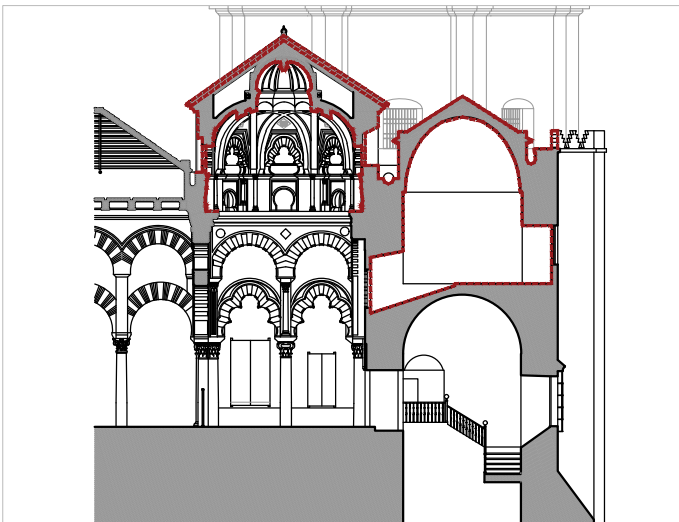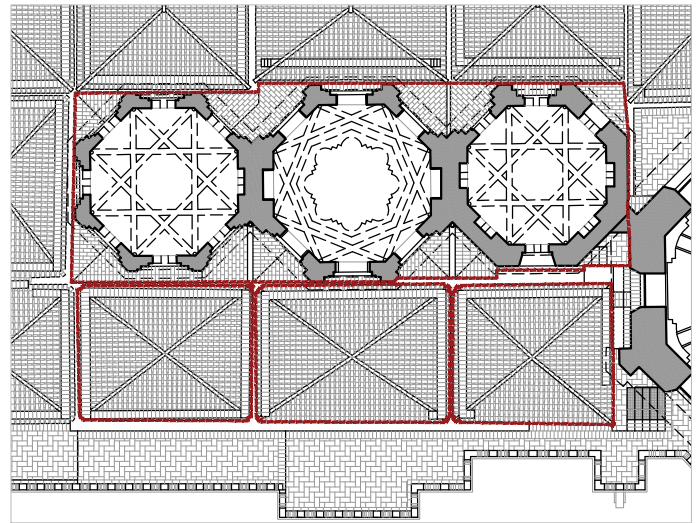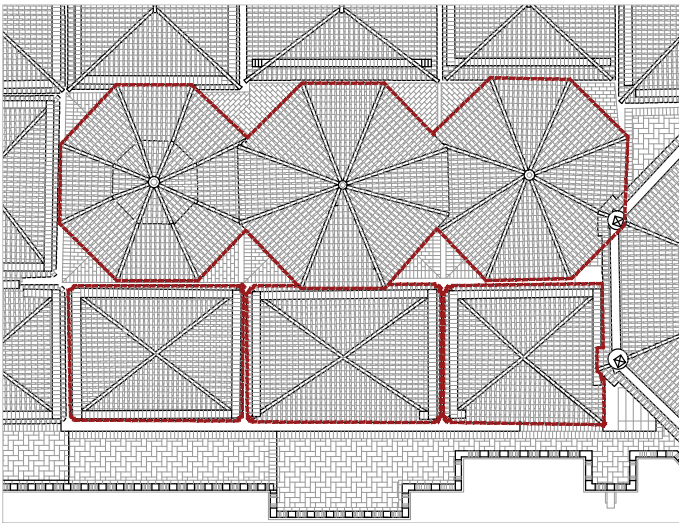

Observaciones

Se comprueba la correcta ejecución de las bases triangulares de las linternas. Tras el levantado de su pavimento para impermeabilizar con planchas de plomo, se vuela a solar con ladrillo macizo quedando esta parte convenientemente protegida del agua. Se comprueba que las pendientes son suficientes.

Se dan a los trabajadores por parte del Coordinador de Seguridad en la obra las pertinentes instrucciones en materia de seguridad, para que los trabajos puedan continuar sin poner en riesgo la salud.

Observaciones

Los trabajos de restauración de las habitaciones del sabat avanzan a buen ritmo. Los paramentos verticales de grandes sillares de piedra arenisca han sido limpiados y sus juntas rellenadas. En los lugares con faltas muy voluminosas se han retacado convenientemente y enlucido en bajorelieve, dejando constancia de anteriores disposiciones estructurales o constructivas.

La celosía que cierra el hueco sur de la sala occidental ha quedado limpia y perfectamente fijada y asegurada su estabilidad.

