

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

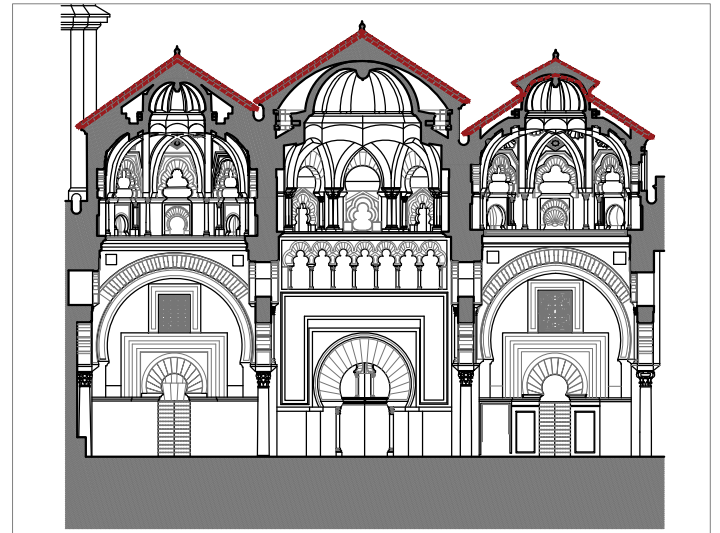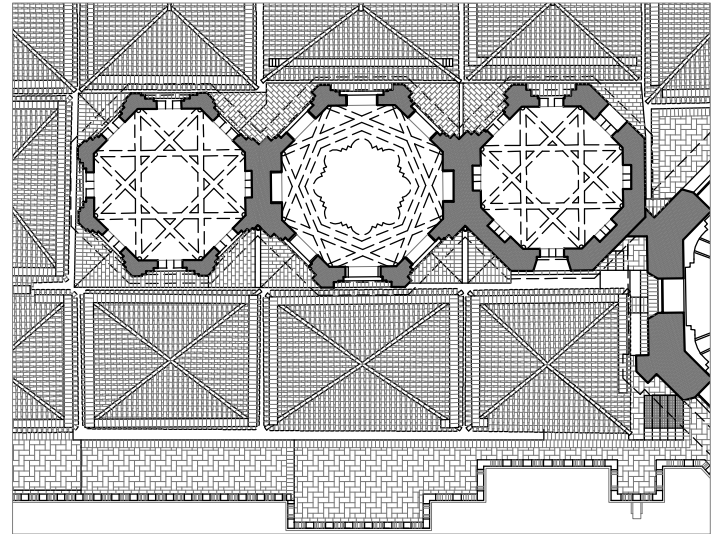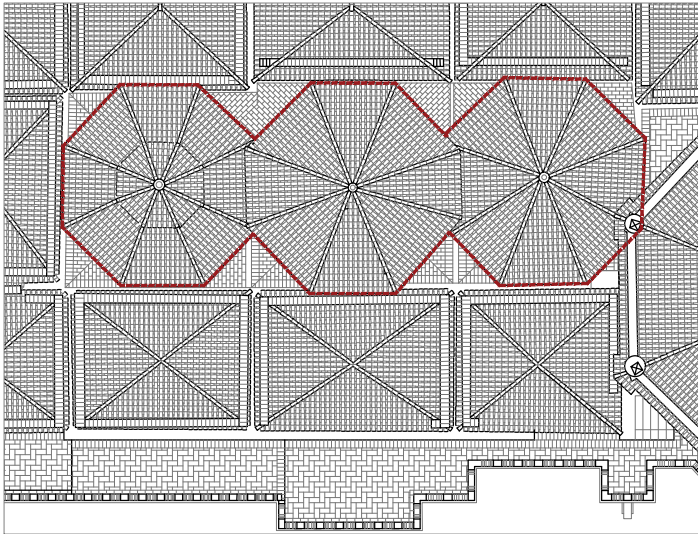

Observaciones

Décima visita

Realizada la protección de las cadenas de atado se replantea el canalón entre las cúpulas central y occidental siguiendo el modelo dispuesto para el canalón ya construido entre las cúpulas centra y oriental.

Se siguen retirando las maderas que hasta el momento presente han protegido las cúpulas de los agentes climáticos, tanto para proseguir con los trabajos de restauración como para continuar con el estudio de los tambores, especialmente en las partes correspondientes a los recrecidos superiores.

Observaciones

Se ordena el destejado del faldón septentrional del cupulín occidental. Esta operación se hará con sumo cuidado y lentitud, pues se desconoce su condición constructiva. Deberá comprobarse que en este cupulín la intervención de Velázquez Bosco, notoria en las bóvedas que recubren las partes inferiores, no tuvo incidencia.

Se establece la limpieza de los lados del tambor octogonal sobre el que se levanta el tejado del cupulín.

