

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

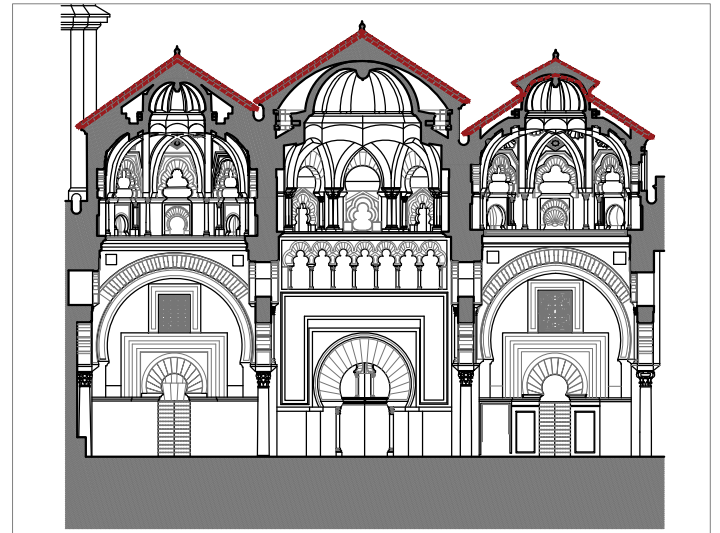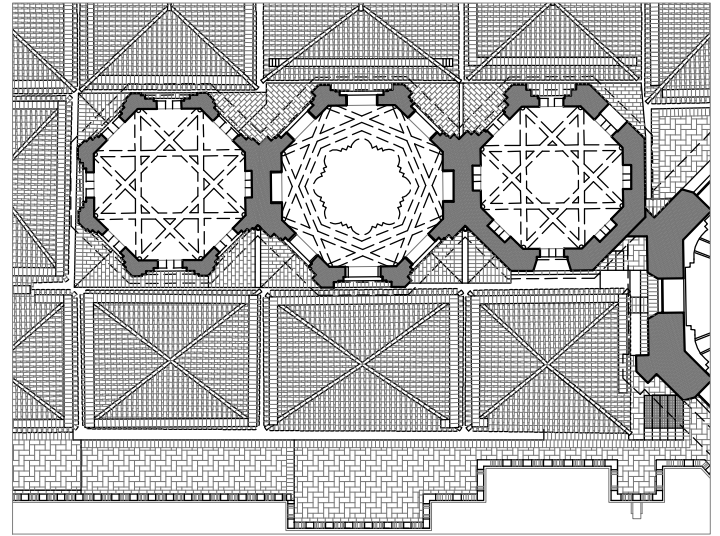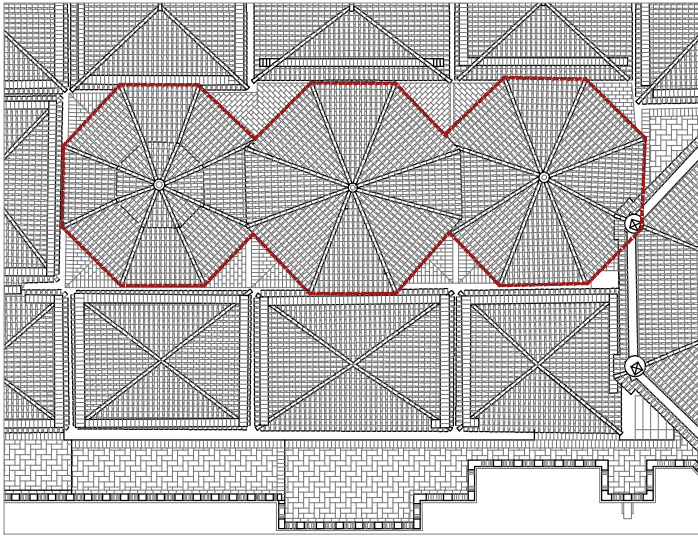

Observaciones

Décimo cuarta visita

Se estudia el levantamiento realizado por Rafael Ortiz del cupulín occidental, comprobándose que la estructura de ladrillo que se ha descubierto es la que construye la bóveda sin que haya ninguna estructura de piedra por debajo.

Se establece una hipótesis sobre cual es el sistema constructivo utilizado en este cupulín, se trata de una cúpula de ladrillo que en su primer tercio parece que está constituida por lo que al exterior se presenta como un tambor y al interior es ya la cúpula.

Observaciones

Esta parte de la cúpula debe estar constituida por sucesivas hiladas de ladrillos seguramente de la misma condición que los descritos en el trasdós del cupulín. Para certificar esta hipótesis habría que hacer catas que por ahora nos se acometen dada la fragilidad que presenta la cúpula. Más adelante se estudiará el modo de proceder en este esfuerzo de conocimiento y de modo que no se comprometa la estabilidad del sistema. Por encima de este tramo se observa una estructura continua constituida por un sardinel corrido de ladrillos recibidos con mortero posiblemente bastardo básicamente de yeso. Esta estructura parece bastante eficaz aunque en algunas partes presenta pérdidas de ladrillo preocupantes. Sobre este cinturón de sardinel se dispone otro de las mismas características aunque parece más descuidado.

A partir de este segundo sardinel arrancan en cada encuentro de los lados del octógono unos nervios de ladrillo, que en ocasiones parecen doblados y que llegan hasta la cumbre. Los espacios entre estos ladrillos, muy deteriorados parece que fueron rellenos con ladrillo dispuestos en plano y recibidos con los mismos morteros que los descritos. No se procede aún a la restauración del cupulín a la espera de que el andamio esté construido y se pueda trabajar con seguridad.

Se mantiene la orden de no tocar el cupulín. Ha comenzado el levantamiento del andamio bajo la cúpula occidental.

