

**Asistentes**

**Canónigo Obrero**  
D. Pedro Soldado




**Arquitectos**  
Gabriel Ruiz Cabrero  
Gabriel Rebollo  
Francisco Rebollo

**Arqueólogo**  
Raimundo Ortiz

**Jefe de Mantenimiento**  
Miguel Espejo

**Aparejadores**  
Jesús Mateo

**Restauradora**  
Anabel Barrera

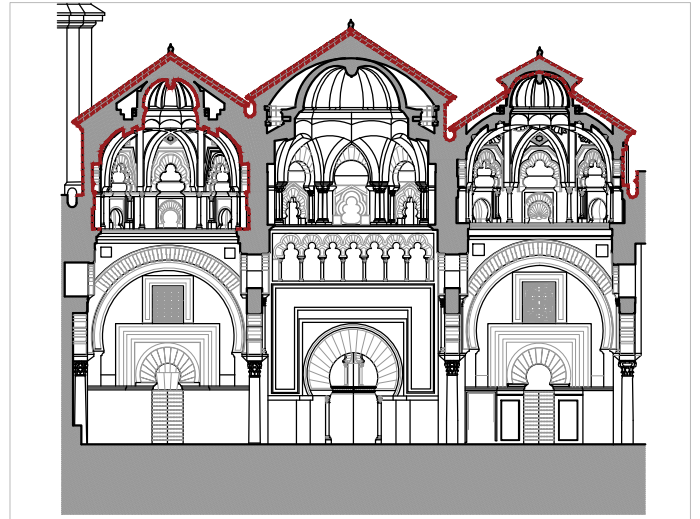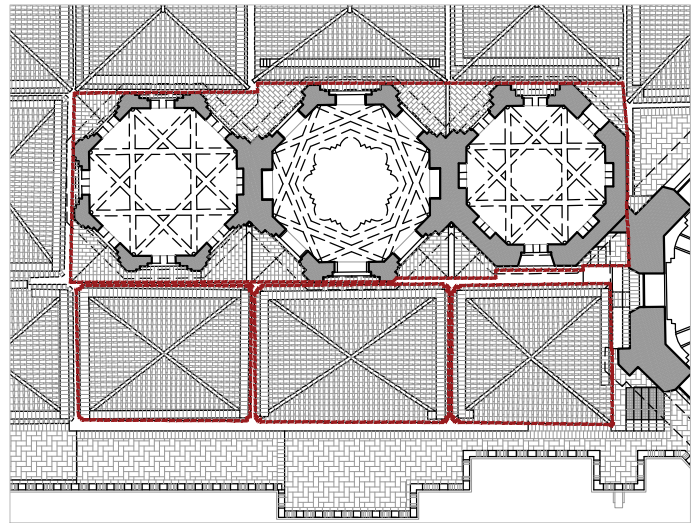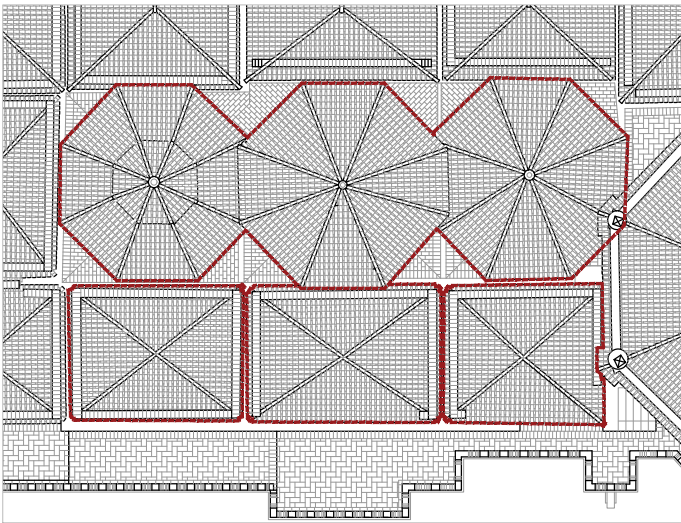

**Observaciones**

Finaliza correctamente el retejado de la cubierta oeste del sabat. Los solapes de las tejas son suficientes en relación a la pendiente de los faldones.

Se indica que no se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.

Se comprueba que todos los residuos de esta y otras partes de la obra se están tratando según lo contemplado en el Estudio de Gestión de Residuos.

### Observaciones

Se supervisan los avances en la restauración de los cerramientos de las linternas octogonales. En lo que se refiere al tambor occidental solo queda por restaurar su cara sureste, la cual está siendo actualmente ejecutada.

Sobre la primera capa de enfoscado, que regulariza las imperfecciones de la piedra, se maestrea y se realiza un doble rayado diagonal que garantice una correcta adherencia de la segunda capa.

