OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **71** FECHA: 18/03/2026

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Agustín Moreno


Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


Arqueólogo
Raimundo Ortiz


Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo


Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

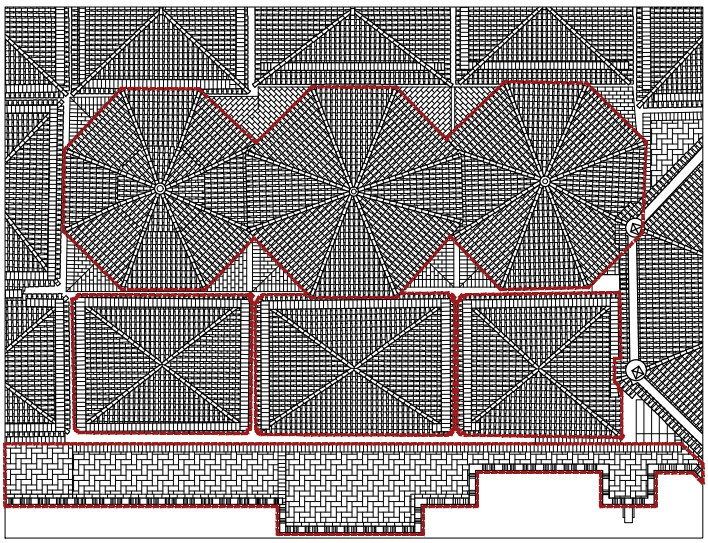

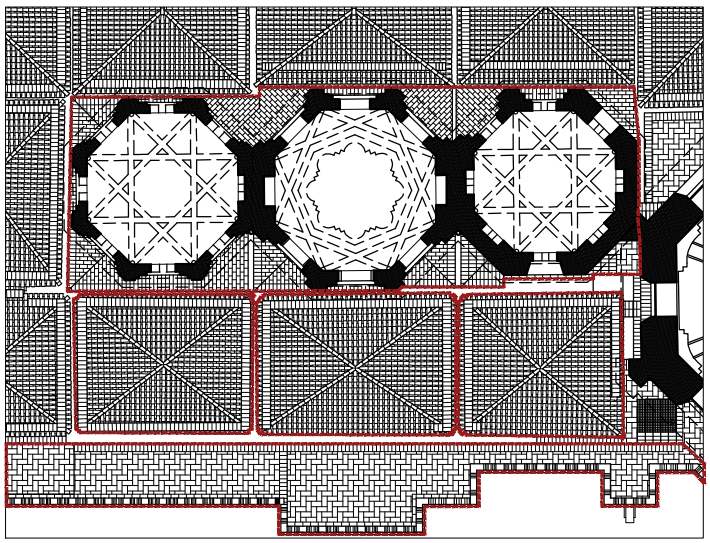

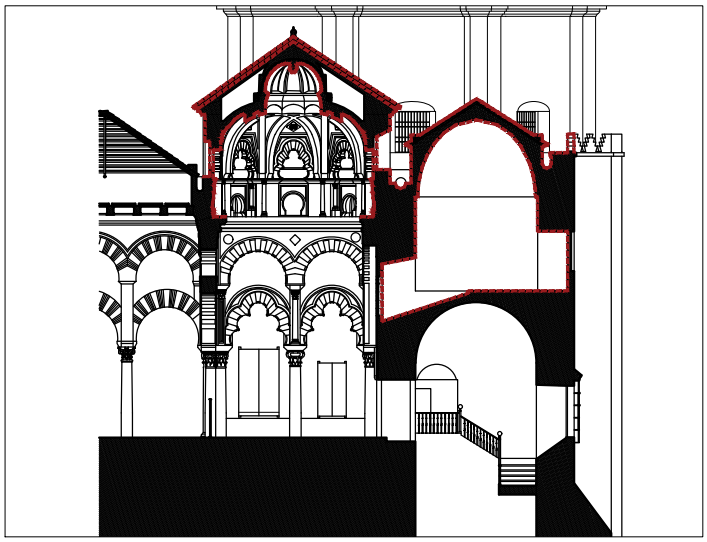

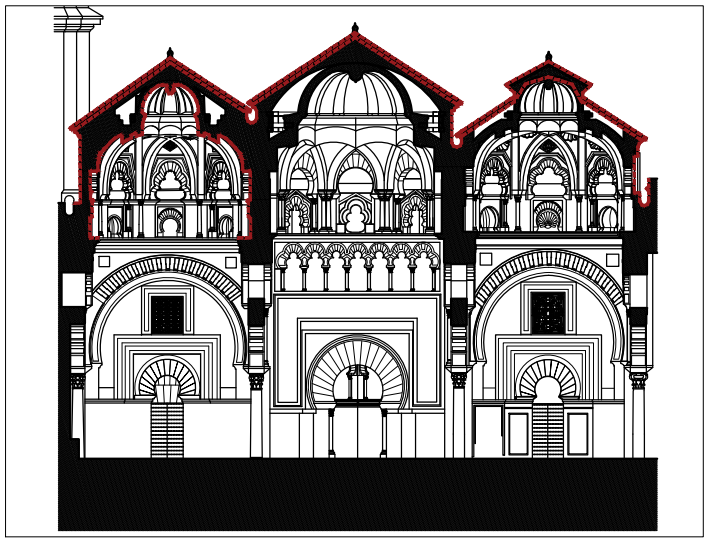

Observaciones

Se supervisa el avance de los trabajos de restauración tanto del interior como del exterior de la Macsura, los cuales avanzan a buen ritmo, y siguiendo las indicaciones que la dirección facultativa le transmite a los trabajadores semanalmente. Además se cumples escrupulosamente las medidas de seguridad y salud en la obra especificadas en el Estudio de Seguridad y Salud redactado a tal efecto, cuyo cumplimiento es coordinado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

La restauración de la cara exterior de los cerramientos que conforman las linternas que soportan a las bóvedas está muy avanzada, trabajandose a día de hoy en la cara sureste del tambor central. Recuperando el perfil desdibujado del contrafuerte de las esquinas. En esta labor es fundamental el aporte histórico que realizan los arqueólogos.

OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **71** FECHA: 18/03/2026

Observaciones

Por otro lado, se supervisa el avance de la adaptación del peldañeado de la escalera exterior de subida al andén desde la salida de la sala oriental del sabat. Estos peldaños, como es costumbre en el edificio, se ejecutan con fábrica de ladrillo macizo tomada con mortero de cal.

Además se han dado comienzo a los trabajos de restauración del andén, en el ámbito comprendido entre la capilla de Santa Teresa y la fachada occidental. Esta parte del proyecto de restauración de la macsura está vinculada al proyecto de restauración de las pinturas murales de la fachada sur, que se comenzará a ejecutar próximamente.

