OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **72** FECHA: 25/03/2026

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Agustín Moreno


Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


Arqueólogo
Raimundo Ortiz


Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo


Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

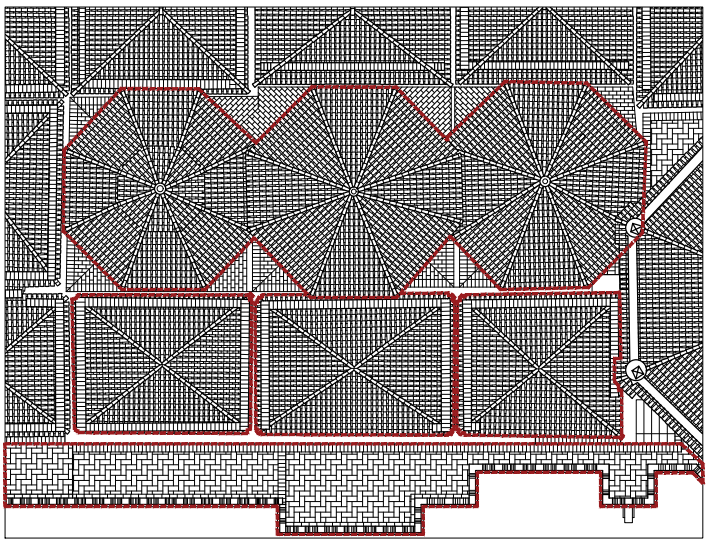

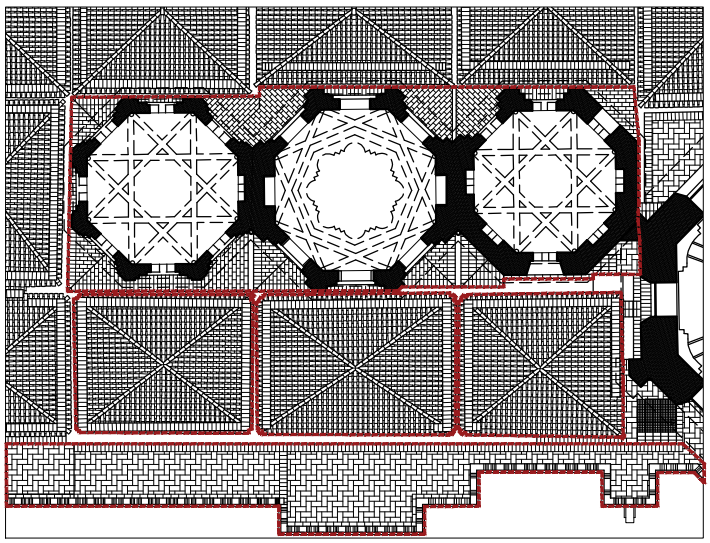

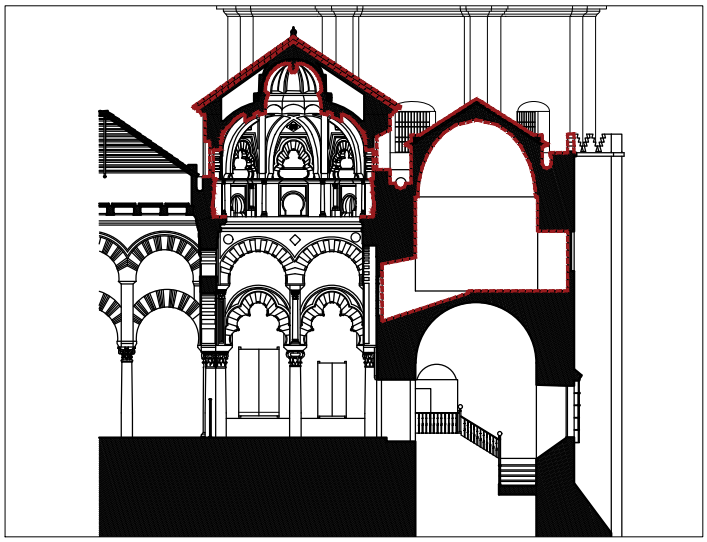

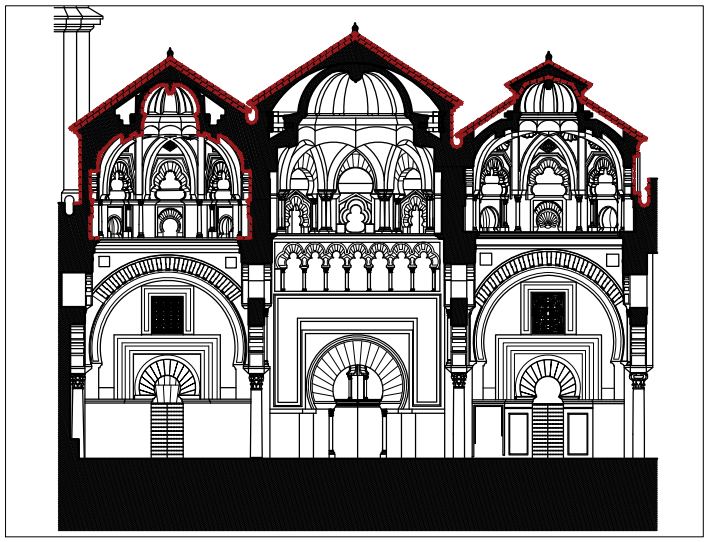

Observaciones

Se supervisa el avance de los trabajos en general y de la zona del andén en particular, cuya restauración comenzó hace días. Esta intervención consiste en el levantado de la solería de ladrillo existente, el replanteo de unas pendientes adecuadas para la evacuación correcta del agua de lluvia, su impermeabilización y posterior recolocación del pavimento recuperado.

En esta zona, donde el andén alcanza la mayor diferencia de cota con respecto a la de la calle se han extremado las medidas de protección coletiva e indivudual para evitar posibles caídas.

OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **72** FECHA: 25/03/2026

Observaciones

Una vez se van terminando de restaurar las celosías que cierran los huecos que exiten en cada uno de los cerramientos de las linternas que soportan las bóvedas, sólo queda cerrarlos parcialmente con vidrios, como así queda relfejado en el proyecto de ejecución. Estos vidrios dispondrán de unas sujeciones de acero inxidable que a su vez van fijadas a los muros, dejando una separación de manera que el aire pueda circular y con ello se favorezca la ventilación del interior de la macsura.

Durante la visita de obra se ha comenzado a replantear las dimensiones exactas de estos vidrios, así como su posición la cual no se repite dos veces puesto que todas las celosías son distintas.





