OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **75** FECHA: 17/06/2026

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Agustín Moreno


Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


Arqueólogo
Raimundo Ortiz


Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo


Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

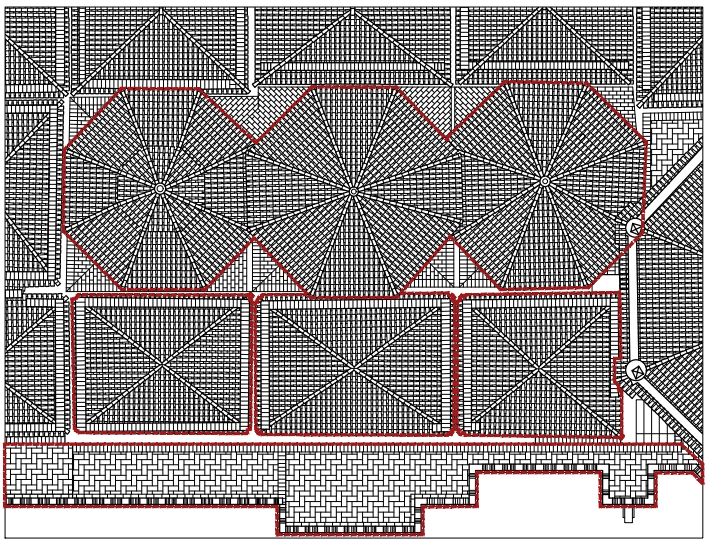

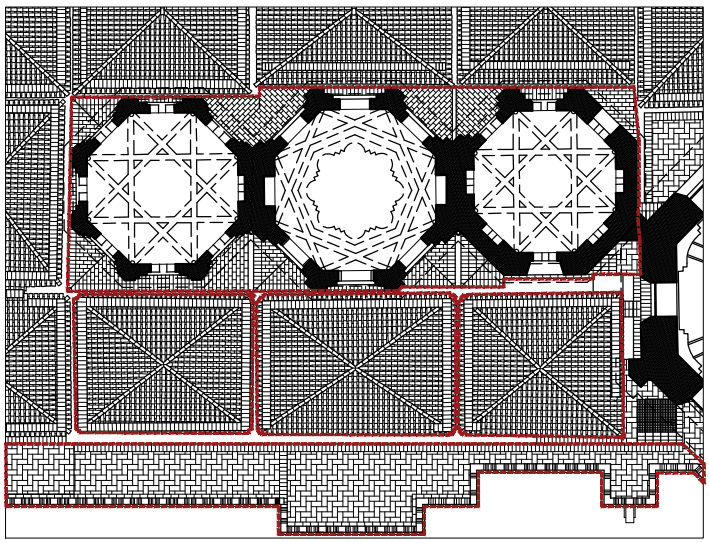

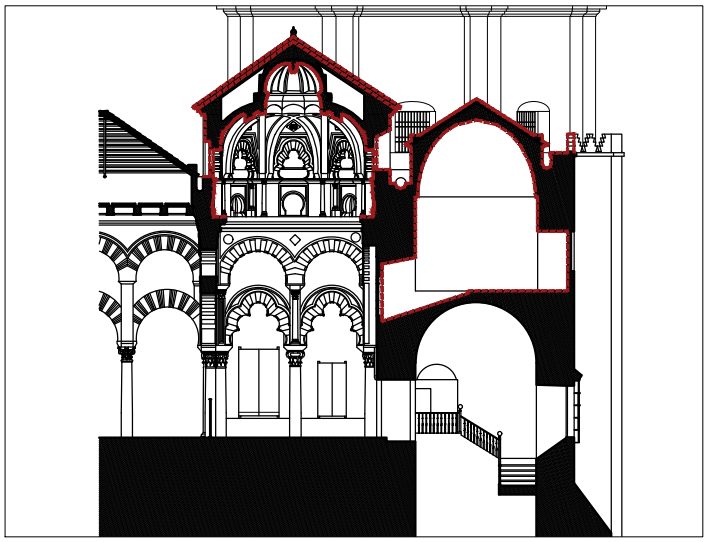

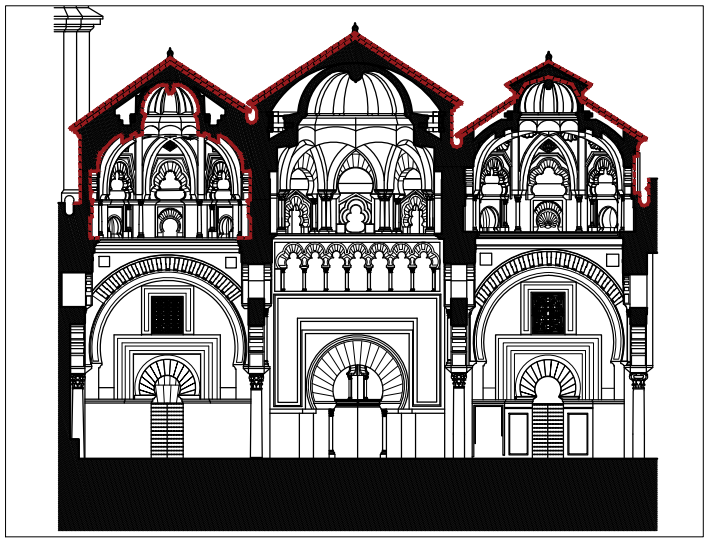

Observaciones

Continúan los trabajos de restauración en la zona del andén sur, solando desde la esquina suroeste hacia oriente. Se ha mejorado el encuentro de este pavimento con el cerramiento que hay bajo la cubierta de teja vidriada que cierra el archivo, dejando una canal con pendiente a una cota inferior por donde discurrirá la tubería de la instalación contra incendios.

Para estos trabajos, dada su peligrosa localización, se han tomado las más estrictas medidas de seguridad de manera que se eviten posibles caídas de trabajadores.

OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **75** FECHA: 17/06/2026

Observaciones

Los trabajos que se desarrollan en la zona de los tambores que sustentan las bóvedas se centran actualmente en el desmontaje, impermeabilización y resolado de las "azoteas" triangulares que quedan entre las linternas. De esta manera se renuevan las soluciones de impermeabilización de estas zonas que ya se pusieron en práctica hace muchos años.

Se empieza a replantear la exacta ubicación y medidas de los cajillos y bajantes de aguas pluviales, contemplado en proyecto, provenientes de las canales que separan las tres cubiertas.





