OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **76** FECHA: 14/07/2026

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Agustín Moreno


Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


Arqueólogo
Raimundo Ortiz


Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo


Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

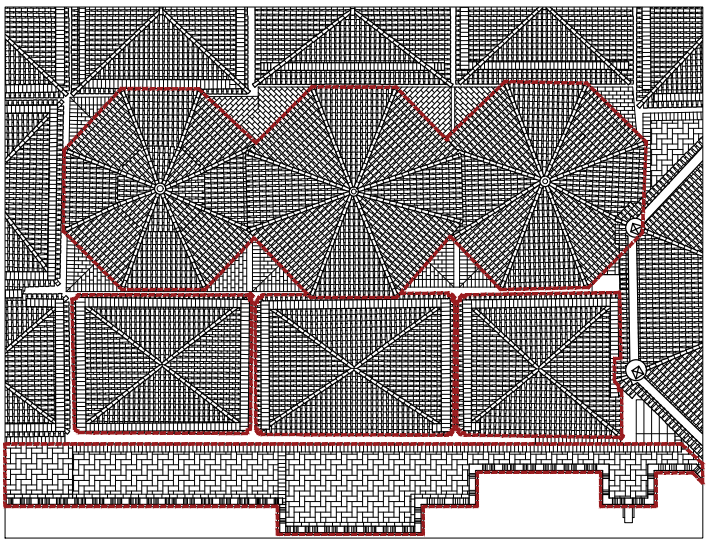

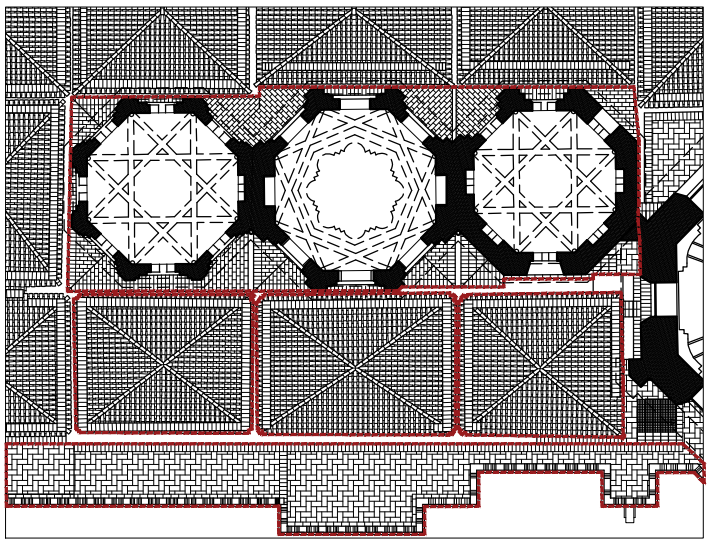

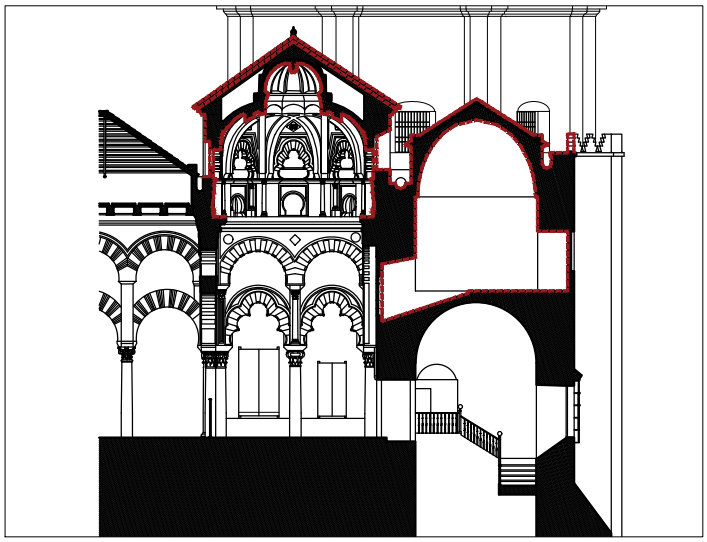

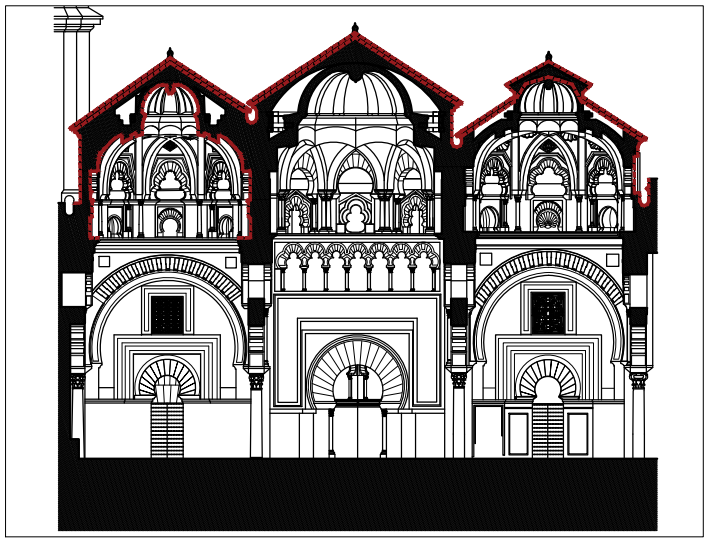

Observaciones

Continúan los trabajos en el andén sur. En esta zona, además de la restauración de la solería con las adecuadas pendientes e impermeabilización, se está acometiendo la restauración de las almenas que rematan la fachada sur en este ámbito.

La separación entre las almenas, en zona del andén correspondiente al ancho del mihrab, se encontraban macizada. El proyecto contempla el desmontaje de este macizado entre almenas de manera que se recupere su configuración original. Este trabajo se ha llevado a cabo correctamente, tomando las precauciones de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento hacia la via pública de material de demolición.

OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **76** FECHA: 14/07/2026

Observaciones

Se avanza en los trabajos de la zona interior del sabat, donde se ha confirmado con la obrería el replanteo del recercado de ladrillo colocado a soga que delimita la parte vista del "conducto de luz" de la sala occidental. También avanza convenientemente el trabajo de reubicación del cableado existente.





