OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **77** FECHA: 05/08/2026

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Agustín Moreno


Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


Arqueólogo
Raimundo Ortiz


Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo


Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

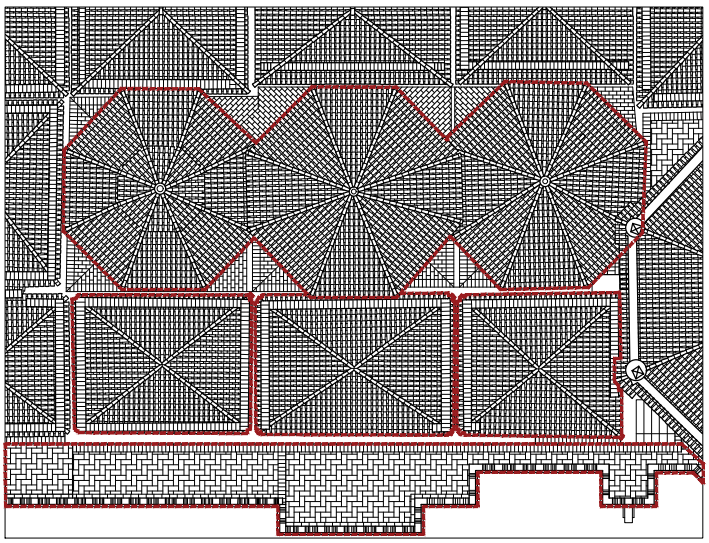

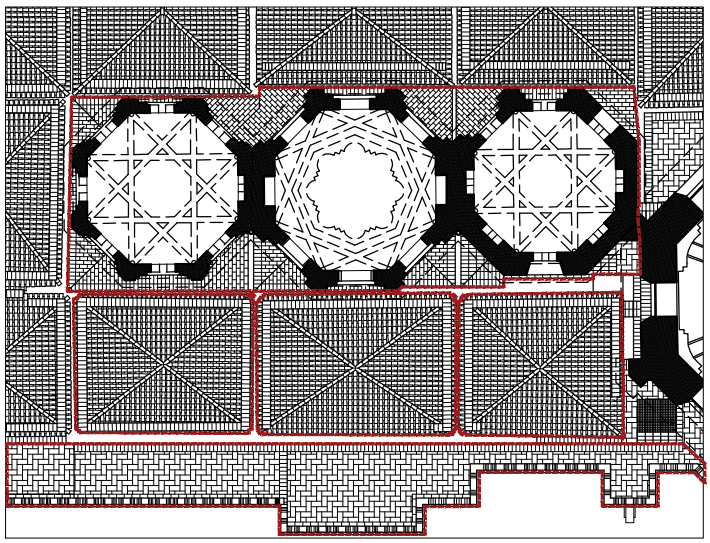

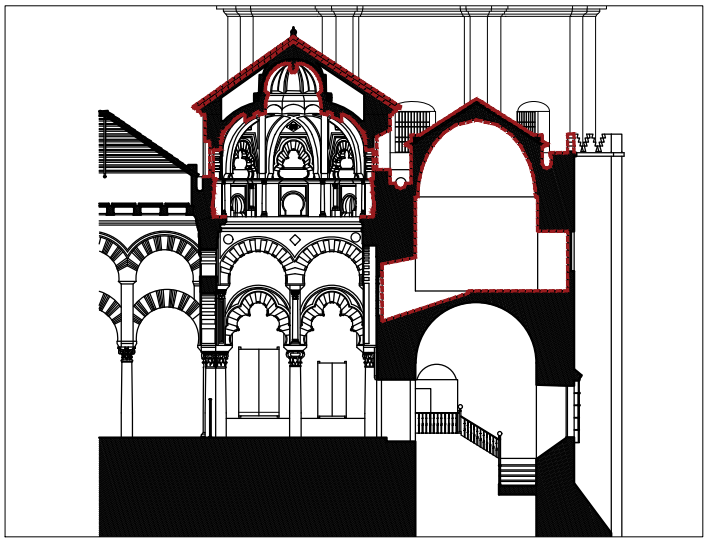

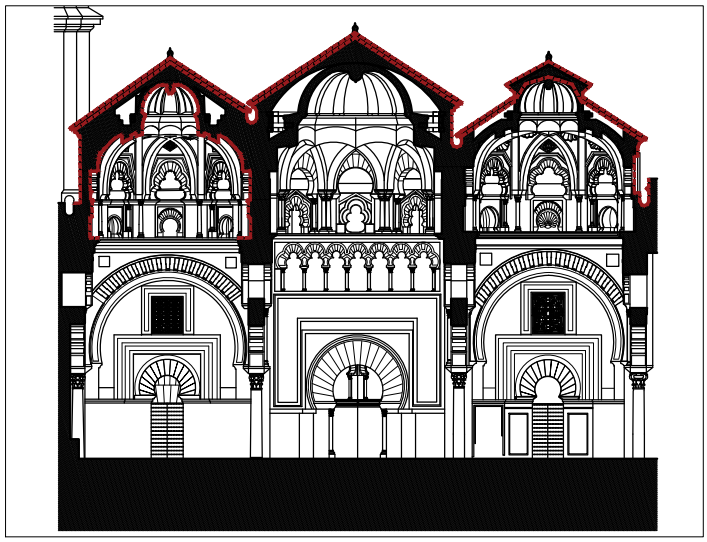

Observaciones

Se supervisa la ejecución de la red de tuberías que conforman la instalación de protección contra incendios. Esta red que ya existía interfiere con los niveles y pendientes de la solería restaurada, además de dificultar el tránsito de los trabajadores para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. Es por ello que, aprovechando la intervención, se mejora en la medida de lo posible su distribución sin mermar su eficacia.

Como planteamiento general la tubería transcurre por el borde interior del andén en dirección este-oeste sobre un rebaje del nivel de la solería de manera que no pueda provocar tropiezos.

VISITA DE OBRA Nº **77** FECHA: 05/08/2026

Observaciones

En los sitios donde la cota de la solería lo permite la tubería queda oculta bajo la misma. La ejecución de esta red de tuberías contra incendios se realiza conforme lo establece el Código Técnico de la Edificación y el resto de normativa sectorial de aplicación.

Para todos estos trabajos realizados en el andén sur se extreman las medidas de seguridad, conforme a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, el Estudio de Seguridad y Salud y las indicaciones del Coordinador de la seguridad y salud en la obra.

