OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **78** FECHA: 09/09/2026

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Agustín Moreno


Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


Arqueólogo
Raimundo Ortiz


Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo


Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

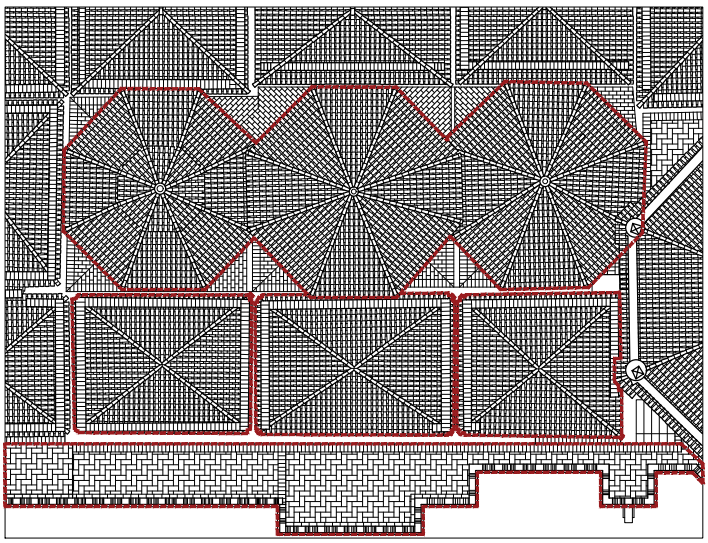

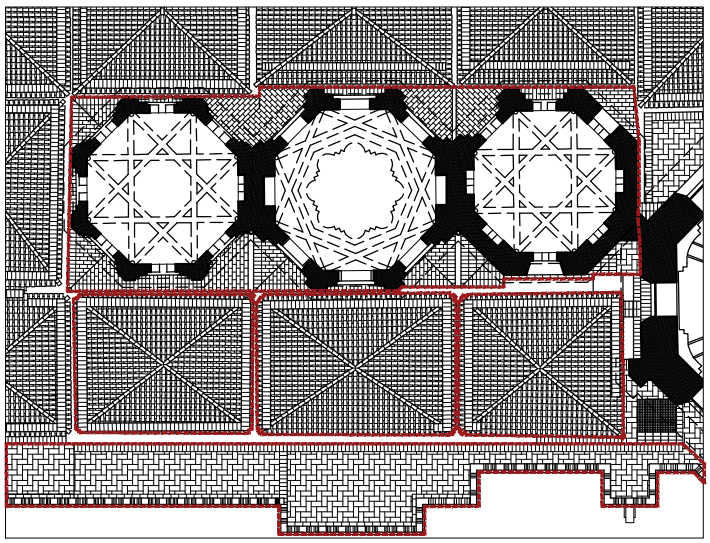

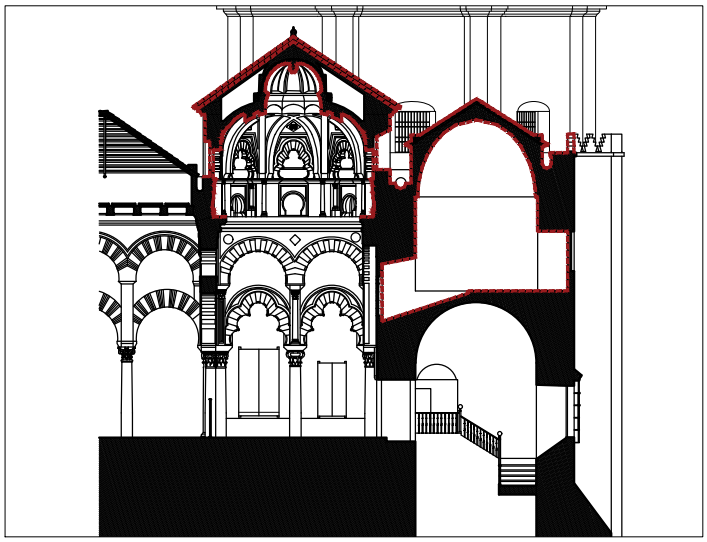

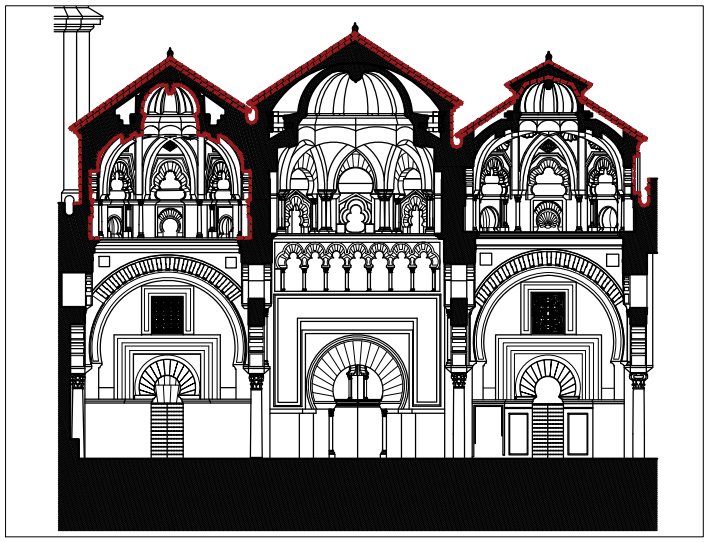

Observaciones

Se reanudan los trabajos de restauración de la macsura. Una vez asegurada la estanqueidad e impermeabilización de las seis cubiertas que cierran tanto el vestíbulo del mihrab como la salas superiores del sabat, se avanzan con los trabajos de restauración paramental del interior. La práctica finalización de los trabajos correspondientes a las tres linternas ha permitido desmontar la cubierta metálica provisional que cubría esta zona y gran parte del andamiaje situado en la zona norte.

En cuanto al andén, tanto la solería como las almenas se han restaurado correctamente. Tanto las líneas de vida como los postes que las sustentan se han recolocado adaptando las altura y ubicación a las condiciones de las nuevas pendientes y niveles de la solería recolocada.

OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **78** FECHA: 09/09/2026

Observaciones

En el interior de la sala occidental del sabat se ha supervisado la correcta ejecución del perímetro de ladrillo que delimita el "conducto de luz". La reubicación del cableado de electricidad, datos, etc.. avanza satisfactoriamente, aprovechando la intervención para retirar aquel que esté obsoleto o en deshuso. También se procede a la restauración de los peldaños que separan a esta sala con la central bajo la que se encuentra el mihrab.

