OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **79** FECHA: 06/10/2026

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Agustín Moreno


Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


Arqueólogo
Raimundo Ortiz


Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo


Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena

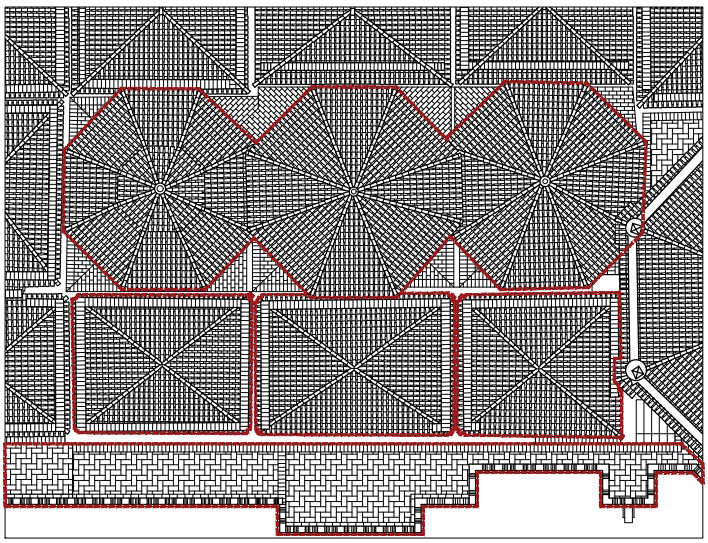

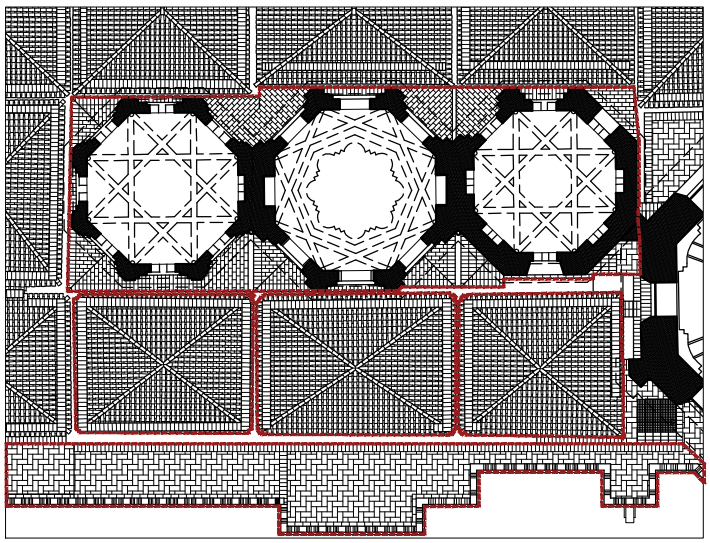

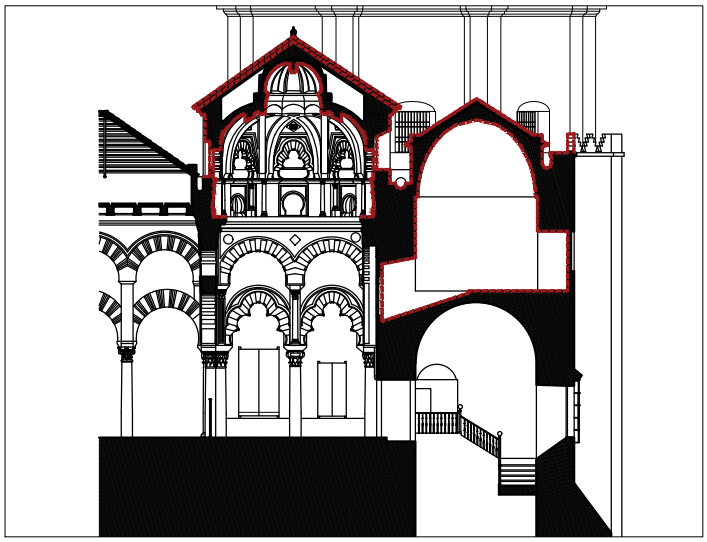

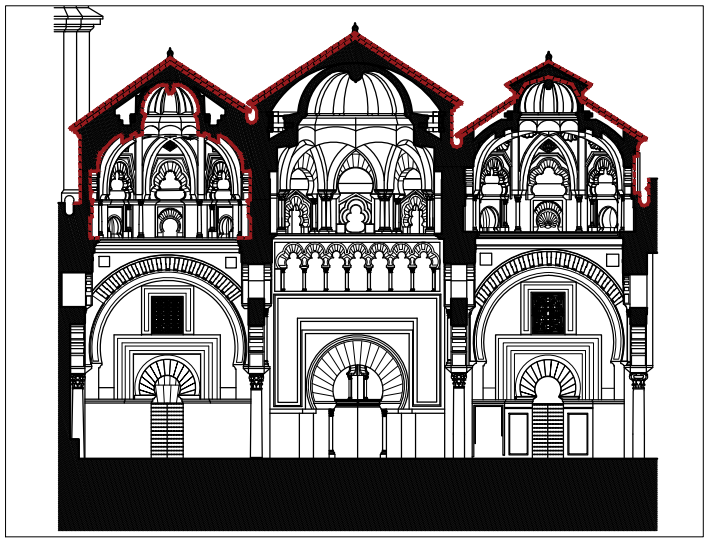

Observaciones

Los trabajos de restauración de los cerramientos de las linternas están próximos a finalizar. Entre las tareas pendientes están los de reimpermeabilización de la "azotea" que separa la linterna oriental de la capilla de Santa Teresa. La solución existente escalonada es mejorada por una única superficie en pediente, impermeabilizada y solada de la misma manera que estaba.

Con respecto a los tambores restaría la colocación de los vidrios de protección y ventilación de las celosías, que se colocarán en las próximas semanas.

OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **79** FECHA: 06/10/2026

Observaciones

En paralelo han dado comienzo los trabajos correspondientes al proyecto de restauración de la fachada sur, que se solapan en su ámbito de intervención con los llevados a cabo en la macsura, circunstancia favorable en cuanto a la disposición en ambas obras de medios auxiliares. La disposición de un andamio en la fachada sur para poder intervenir en los balcones permite restaurar con seguridad la cara exterior de las almenas.

